PROPOSAL & MONTHLY REPORT — SAMPLE

# Claude導入による業務改善のご提案 & 初月レポート

現状業務の棚卸しから、対象業務の選定、
誤りを防ぐ運用ルール、月次の進め方までを
1冊にまとめた見本です。

ご提案先

**サンプル部品商事株式会社 様**

機械部品の卸売／従業員20名（営業6・業務4・倉庫7・管理3）

※ 架空の会社・数値で作成した見本です。実在の企業・取引とは関係ありません。

CONTENTS


01 現状業務の棚卸しと優先度（効果 × 難易度）

02 改善案A：見積依頼メール → 見積書の下書き

03 改善案B・C：在庫/納期の回答、注文書の転記

04 誤りを防ぐ4つの仕組み（Human-in-the-Loop）

05 システム構成：階層型マルチエージェント

06 月次の進め方（月例会・週報のサンプル）

07 リスクと運用ルール


**① 使う所を絞る**

効果と難易度で順位付けし、AIが不向きな業務は対象外にします。

**② 誤りを前提に設計**

参照先の限定・二重チェック・裏取り・人の承認を必ず組み込みます。

**③ 動く形で渡す**

Claude Codeで GAS／スプレッドシートの仕組みを作り、手順書と一緒に引き継ぎます。


作成：松村 貴士（ZAZOU株式会社）


# 01 現状業務の棚卸しと優先度

ヒアリングで挙がった8業務を「月の作業時間」と「AIとの相性」で整理し、**A・B・Cの3業務**から着手します。

| | 業務 | 担当 | 月時間 | 今の困りごと | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | **見積依頼メール→見積書作成** | 営業 | **42h** | 品番・数量の読み取りと単価表の参照が手作業 | 着手 |
| B | **在庫・納期の問い合わせ回答** | 業務 | **30h** | 在庫表を見て毎回文面を作成 | 着手 |
| C | **FAX・PDF注文書の転記** | 業務 | **24h** | 書式が取引先ごとに違い、転記ミスが月数件 | 着手 |
| D | 仕入先への発注書作成 | 業務 | **12h** | 発注点の判断に経験が必要 | 次期 |
| E | 新規品番のマスタ登録 | 管理 | **6h** | メーカー資料からの仕様転記 | 次期 |
| F | 月次の売上集計 | 管理 | **5h** | 集計表の手直し | 関数で対応 |
| G | 請求書の発行 | 管理 | **8h** | 会計ソフトで処理済み | 対象外 |
| H | 電話での受注・相談 | 営業 | **20h** | 相手の状況に合わせた判断が中心 | 対象外 |

月時間は社内ヒアリングによる概算（架空）。F は AI を使わずスプレッドシートの関数とテンプレートで十分なため、AI導入の対象から外しています。

**優先度マトリクス**

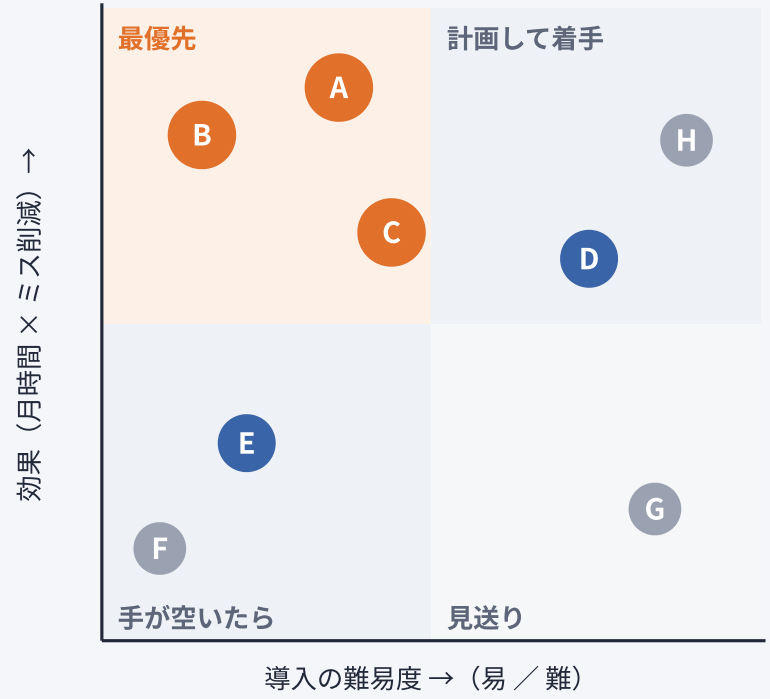


H は効果は大きいものの、判断の大半を人が担う業務のため AI 化はしません（通話後のメモ整理は次期に検討）。

# 02 改善案A：見積依頼メール → 見積書の下書き

AIの役割は「読み取り」と「下書き」まで。**単価は単価表からのみ引用し、送信は担当者が確認してから**行います。

### Before 現在の流れ（1件 約25分）

1. 受信メールを開き、品番・数量・希望納期を読み取る 人
2. 単価表（Excel）で品番を検索し、得意先ランク別の単価を確認 人
3. 在庫表を開いて、納期の目安を確認 人
4. 見積書テンプレートに手入力し、PDF化 人
5. 返信文を作成して送信 人

課題：品番の打ち間違い・旧単価の参照が月に数件。繁忙期は返信が翌日に。

### After 導入後の流れ（人の作業は確認と承認）

1. 専用ラベルのメールを定時に取得 GAS
2. 本文から品番・数量・納期を抽出し、表に整理 Claude
3. 品番を単価表・在庫表と**機械的に照合**（AIは単価を作らない） GAS
4. 見積書・返信文を下書きし、照合AIが不一致を指摘 Claude
5. **担当者が下書きを確認・修正し、送信ボタンを押す** 人

単価表にない品番・数量の読み取りが曖昧なものは「要確認」として赤字で止め、下書きを作りません。

### 使うもの

| | |
|---|---|
| **Gmail** | 見積依頼をラベルで振り分け（既存の運用を変えない） |
| **スプレッドシート** | 単価表・在庫表・見積台帳（事実シート） |
| **GAS** | メール取得・照合・下書き保存。Claude Codeで作成し、コードと手順書を納品 |
| **Claude** | 文面からの項目抽出、返信文の下書き、照合結果のチェック |

### 初月の目標（架空の数値）

**25→8分**
1件あたりの作業時間

**0件**
旧単価での送付

確認作業の時間は必ず残します。短縮分は「確認の質」を落とさない範囲で評価します。

# 03 改善案B・C：在庫/納期の回答、注文書の転記

どちらも **「AIが下書き → 人が照合して確定」** の形にそろえ、現場の手順を大きく変えずに導入します。

## B　在庫・納期の問い合わせ回答

難易度：低

| | Before | After |
|---|---|---|
| **確認** | 在庫表を開いて品番を検索 | GASが在庫表から該当行を取得 |
| **文面** | 毎回ゼロから作成 | Claudeが定型に沿って下書き（数値は在庫表の値を差し込むだけ） |
| **送信** | 担当者 | **担当者が数値を確認して送信** |

【下書き例】
品番 SB-6204ZZ：在庫 120個（在庫表 10/30 9:00 更新）
ご希望の100個は、本日15時までのご注文で当日出荷が可能です。
▲ 在庫表の更新が24時間以上前のため、出荷担当に確認してください

在庫数の鮮度（更新時刻）を必ず表示し、古い場合は警告を出します。

## C　FAX・PDF注文書の転記

難易度：中

| | Before | After |
|---|---|---|
| **読取** | 紙を見ながら受注表へ手入力 | PDFをフォルダに置くと、Claudeが項目を抽出 |
| **照合** | 入力者の目視のみ | 品番マスタと突合し、別のAIが原本と抽出結果を比較 |
| **確定** | 入力した時点で確定 | **原本と並べた確認画面で人が承認して確定** |

注文書PDF ▶ 抽出 Claude ▶ 突合・比較 GAS＋別AI ▶ **人が承認 確定**

手書き・かすれなど読み取りに自信がない項目は空欄のまま残し、推測で埋めません。

**導入の順番**

1か月目　B を先行稼働（仕組みが単純で、効果を確認しやすい）

1〜2か月目　A を営業1名で試行 → 全員へ展開

2〜3か月目　C を取引先上位5社の書式から対応

# 04 誤りを防ぐ4つの仕組み（Human-in-the-Loop）

AIはもっともらしい誤り（ハルシネーション）を出すことがある、という前提で **4段階のチェック**を組み込みます。

### 1 参照先を「事実シート」に限定

単価・在庫・顧客情報は、スプレッドシートの事実シートにある値だけを使わせます。シートにない情報は「不明」と返すよう指示し、AIが数値を作る余地をなくします。

### 2 別のAIで二重チェック

作成役とは別の照合役AIが、原文・事実シートと下書きを突き合わせ、不一致・抜け・根拠のない記述を指摘します。指摘があれば作り直し、解消しない場合は人に回します。


### 3 一次情報で裏取り

メーカーの仕様・価格改定など外部の情報は、公式資料や原本で確認できたものだけを反映。下書きには参照元（シート名・行、資料名）を併記します。

### 4 元に戻せない判断は人が行う

メール送信・受注の確定・マスタの更新など、取り消しの難しい操作はAIに実行させません。**担当者が確認して承認ボタンを押した時だけ**実行されます。


### チェックの流れ（改善案Aの例）

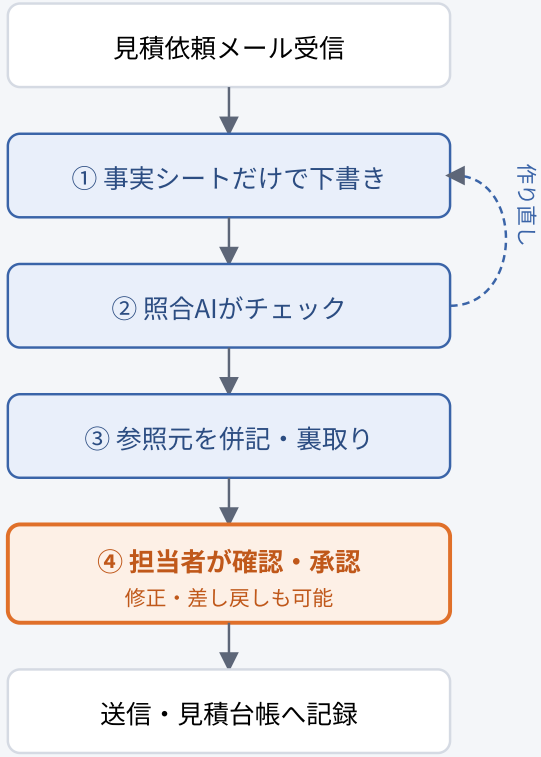


修正内容は記録し、月例会で「どこを直したか」を確認して指示文や事実シートを改善します。

# 05 システム構成：階層型マルチエージェント

統括AIが担当AIに指示・確認し、結果を戻して改善する構成です。**担当ごとに役割と参照先を分ける**ことで、誤りの発生箇所を特定しやすくします。

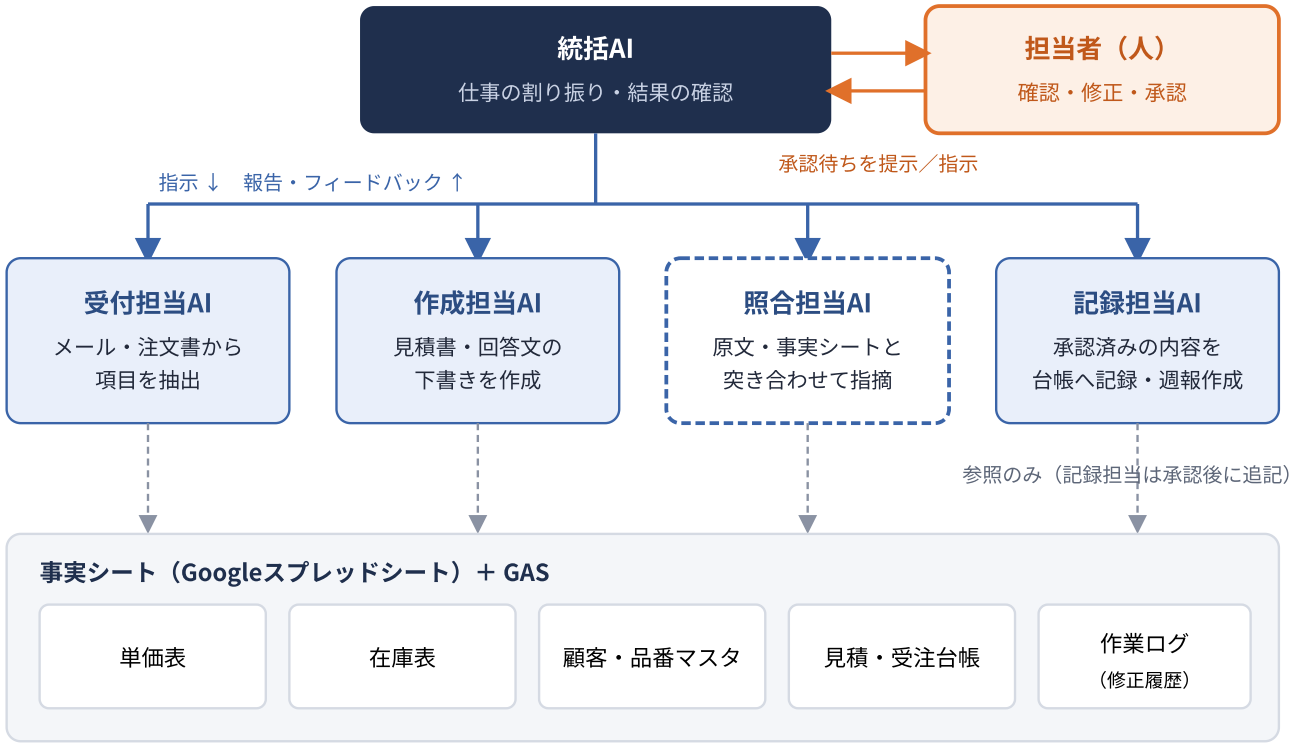


### 役割を分ける理由

- 作成役と照合役を分け、同じAIが自分の誤りを見逃す状況を避ける
- 担当ごとに参照できるシートを限定し、権限を最小にする
- 作業ログから「どの担当で誤ったか」を追える

### 実装と引き継ぎ

- GASのコードは Claude Code で作成し、動作確認のうえ納品
- 指示文（プロンプト）・シート構成・手順書を一式で引き継ぎ
- APIキーや権限設定は貴社のアカウントで管理

### 自社で運用中の仕組み

この構成は、私の会社（ZAZOU株式会社／EC事業）で2026年10月から運用している仕組みがもとです。GAS・スプレッドシートと組み合わせ、メール確認・在庫同期・送り状CSV作成・案件管理に使っています。

# 06 月次の進め方（月16時間）

月例会1回と週報で状況を共有します。**週報には「AIの誤りと人の修正」を毎回記載**し、改善につなげます。

## 時間の配分（目安）




| | |
|---|---|
| ■ 仕組みの作成・修正（Claude Code） | **9h** |
| ■ 現場の確認・試行の立ち会い | **3h** |
| ■ 月例会（準備・実施・議事メモ） | **2h** |
| ■ 週報（4回） | **2h** |

## 月例会のアジェンダ（60分）

| | |
|---|---|
| **10分** | 先月の結果（数値・誤り件数） |
| **20分** | 修正が多かった箇所と原因、対策 |
| **20分** | 現場の声・次に手を付ける業務 |
| **10分** | 来月の作業と、貴社に決めていただく事項 |

## 週報サンプル（第3週）

送付：毎週金曜／チャットまたはメール

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **今週やったこと** | 改善案B を業務担当2名で本番稼働。改善案A の見積下書きを営業1名で試行開始 |
| **数値** | B：回答下書き 46件／うち人が修正 5件（11%）　A：下書き 18件／修正 4件 |
| **AIの誤りと修正** | ①「SB-6204」と「SB-6204ZZ」を同一品番として扱った（照合AIが検出 → 品番は完全一致のみ許可に変更）<br>② 返信文の敬語が取引先の慣例と違う（定型文を差し替え） |
| **止めた案件** | 単価表にない品番 3件 → 下書きを作らず「要確認」で担当者へ |
| **来週の予定** | A の試行を営業3名に拡大／C の対象書式（上位5社）を収集 |
| **ご相談** | **在庫表の更新が1日1回のため、午後の回答に古い数値が出る可能性。更新回数の見直しをご検討ください** |

| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
|---|---|---|---|
| 業務の棚卸し・事実シート整備 | B を作成・テスト | B 本番／A 試行 | 初月の振り返り・月例会 |

# 07 リスクと運用ルール

想定されるリスクを先に洗い出し、**「誰が・いつ・何を確認するか」**を運用ルールとして決めておきます。

| リスク | 対策 | 確認する人 |
|---|---|---|
| **誤った単価・在庫での回答** | 数値は事実シートからのみ差し込み、AIは数値を書かない。在庫表の更新時刻を表示 | 担当者 |
| **読み取りの誤り** | 照合AIで原本と比較。曖昧な項目は空欄で止め、推測で埋めない | 担当者 |
| **確認の形骸化** | 承認画面に「AIが自信のない箇所」を色分け表示。修正率を週報で追跡 | 業務責任者 |
| **情報の取り扱い** | AIに渡す項目を必要最小限に限定。貴社の規程・契約に沿って利用範囲を事前に決める | 管理部門 |
| **仕組みの属人化** | コード・指示文・手順書を貴社の共有フォルダで管理。担当交代時の引き継ぎ手順を用意 | 松村→貴社 |
| **停止・不具合** | 停止時は従来の手作業に戻せるよう、既存の手順を残しておく。エラーは担当者に通知 | 担当者 |

### 運用ルール（5つ）

1. 送信・確定・マスタ更新は、必ず人が承認してから
2. AIは事実シートにない情報を使わない（不明は不明と書く）
3. 外部の情報は、一次情報で確認できたものだけ反映
4. 人が修正した内容は記録し、月例会で振り返る
5. 新しい業務に広げる時は、試行 → 評価 → 展開の順で

### 開始前に確認させていただきたいこと

- 対象業務の実データ（単価表・在庫表）の形式と更新頻度
- AIに渡してよい情報の範囲と、社内の利用ルール
- 承認を担当する方と、確認にかけられる時間
